

NOTA: Le nombre de files d'étais sur ce schéma est un exemple. Se referer au plan pour savoir le nombre de files d'étais à mettre en oeuvre dans chaque zone (Représentation non contractuelle, se referer au PPSPS de l'entreprise) (VOIR RECOMMANDATIONS PROFESSIONELLES FIB / CERIB / FFB)

Semelle de répartition optionelle

selon caractéristique de sol

MISE EN OEUVRE DES PREDALLES -Chapeaux de rive Chapeaux de continuité Enrobage chapeaux selon classe d'exposition Renforts sur les prédalles Enrobage : 1cm min Aciers de pontage au droit des joints -Dalle de compression Chapeaux-1 - Mise en place des étais, Voir page n°7 2 - Pose des prédalles, Ferraillage et coulage table de compression, -Prédalle Repos 4 - Contrôle des résistances béton, sur appui Etais 5 - Enlèvement des étais. Voir page n°4 Renforts de couture + renforts de trémie 4 x 2 B500B Ø10 **IMPORTANT**: Clavetage des éléments porteurs obligatoires, sauf indications contraires page n°6 avant pose prédalles. Réservation bleuesecurisée

REMARQUES IMPORTANTES

Le dispositif de protection collective retenu par l'entreprise est : DAK

1- REPOS SUR APPUI:

- repos effectif "u" constaté et mesuré comme indiqué sur la figure ci-contre

Prédalle Support

IMPORTANT!

si le repos minimum effectif "u" mesuré sur le chantier au moment de la pose est inférieur au repos minimum des tableaux, la dalle en cause doit être posée sur lisse.

Alerter le responsable du chantier qui devra se mettre en rapport avec notre service technique dans les plus brefs délais.

Les lisses de rive reprennent une charge maximale de :

0,8 T/m **1,0** x a TN $R_{\scriptscriptstyle E}$

a: distance entre étais

2- Veiller à ce que les armatures filantes du support ne gênent pas la pose des prédalles. Si nécessaire, mettre les armatures en place après la pose des prédalles

ACIER A METTRE EN PLACE **APRES** LA POSE DES PREDALLES

3- La tolérance sur la distance entre éléments supports est prise égale à + ou - 2cm.

IMPORTANT

pour plus de renseignements se rapporter aux :

=> Fiches de l'OPPBTP et de l'INRS


=> CPT Planchers Titre II Ed 2014 Document mis à jour le 03/03/16

=> Au droit des réservations, certaines prédalles sont renforcées par des bandes béton qui ne pourront être supprimées que lorsque la résistance visée à 28 jours de la dalle de compression sera atteinte.


Etaiement à contreventer horizontalement


voir fiche OPPBTP E3 F 05 10

PRECONISATIONS DE POSE PREDALLES





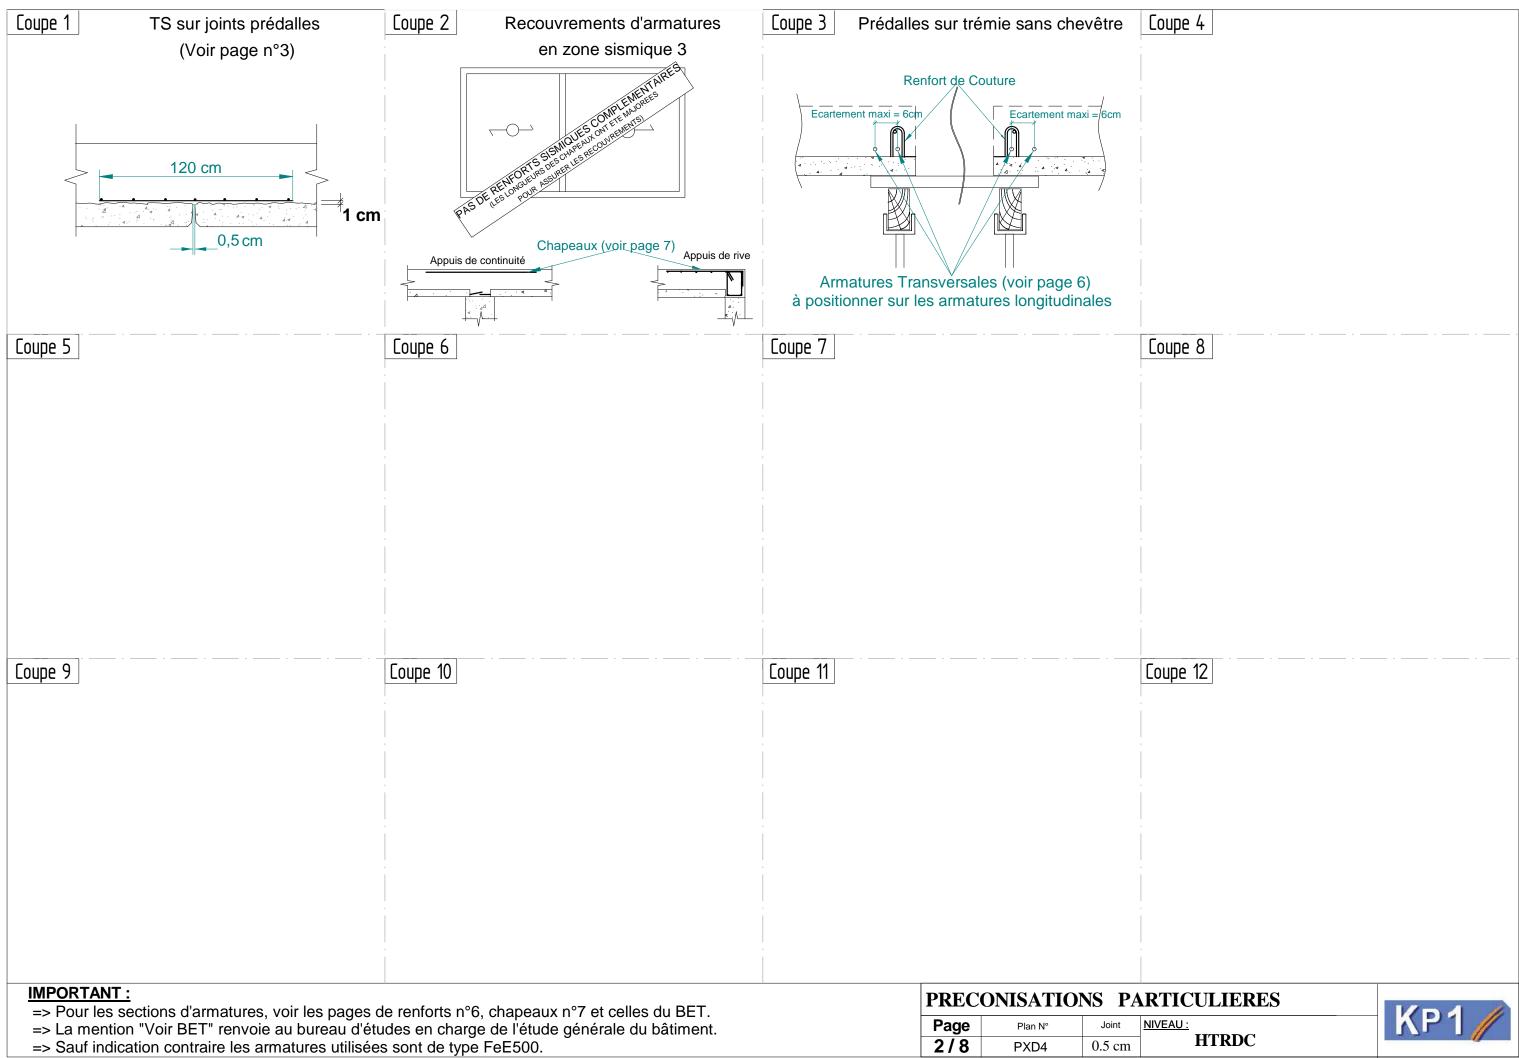

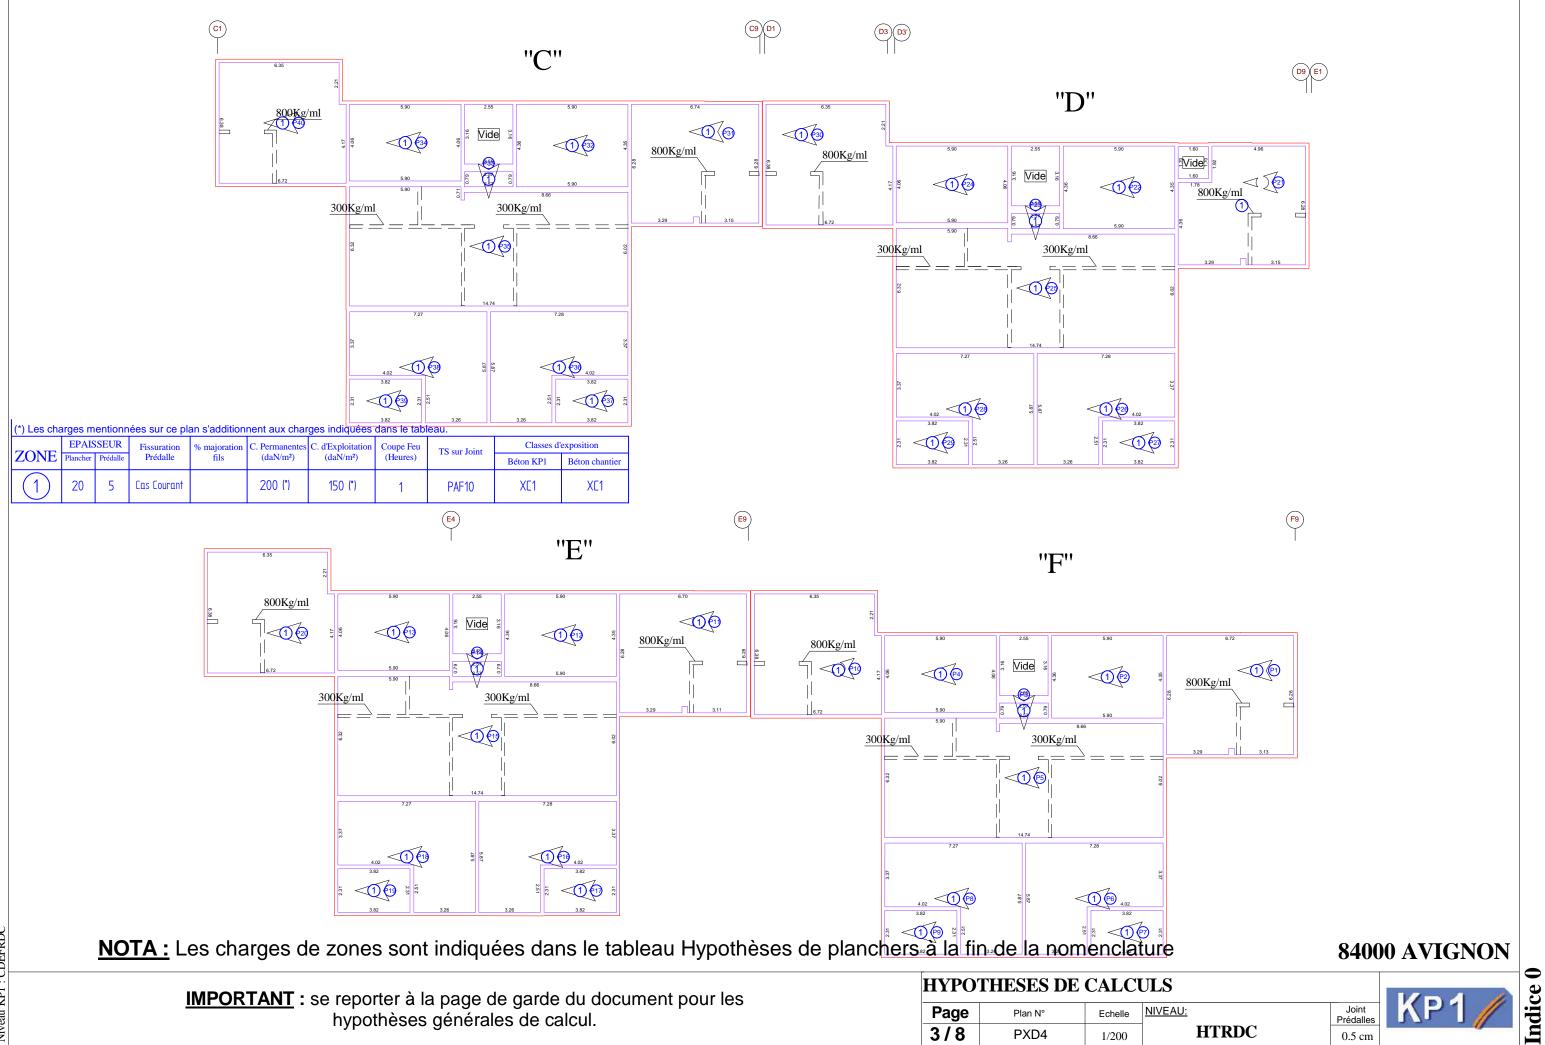

Affaire KP1:3180297 Niveau KP1:CDEFRDC

Version CAO MILLENIUM: 8.0.59 / Version Calcul: 1.67

hypothèses générales de calcul.

Projeteur Bureau d'Etudes : x.defontenay 04.90.15.26.35 be.pujaut@kp1.fr

Echelle

Plan N°

PXD4

NIVEAU:

HTRDC

Page


3/8

06/11/18 - 09:46:35

Joint Prédalles

0.5 cm



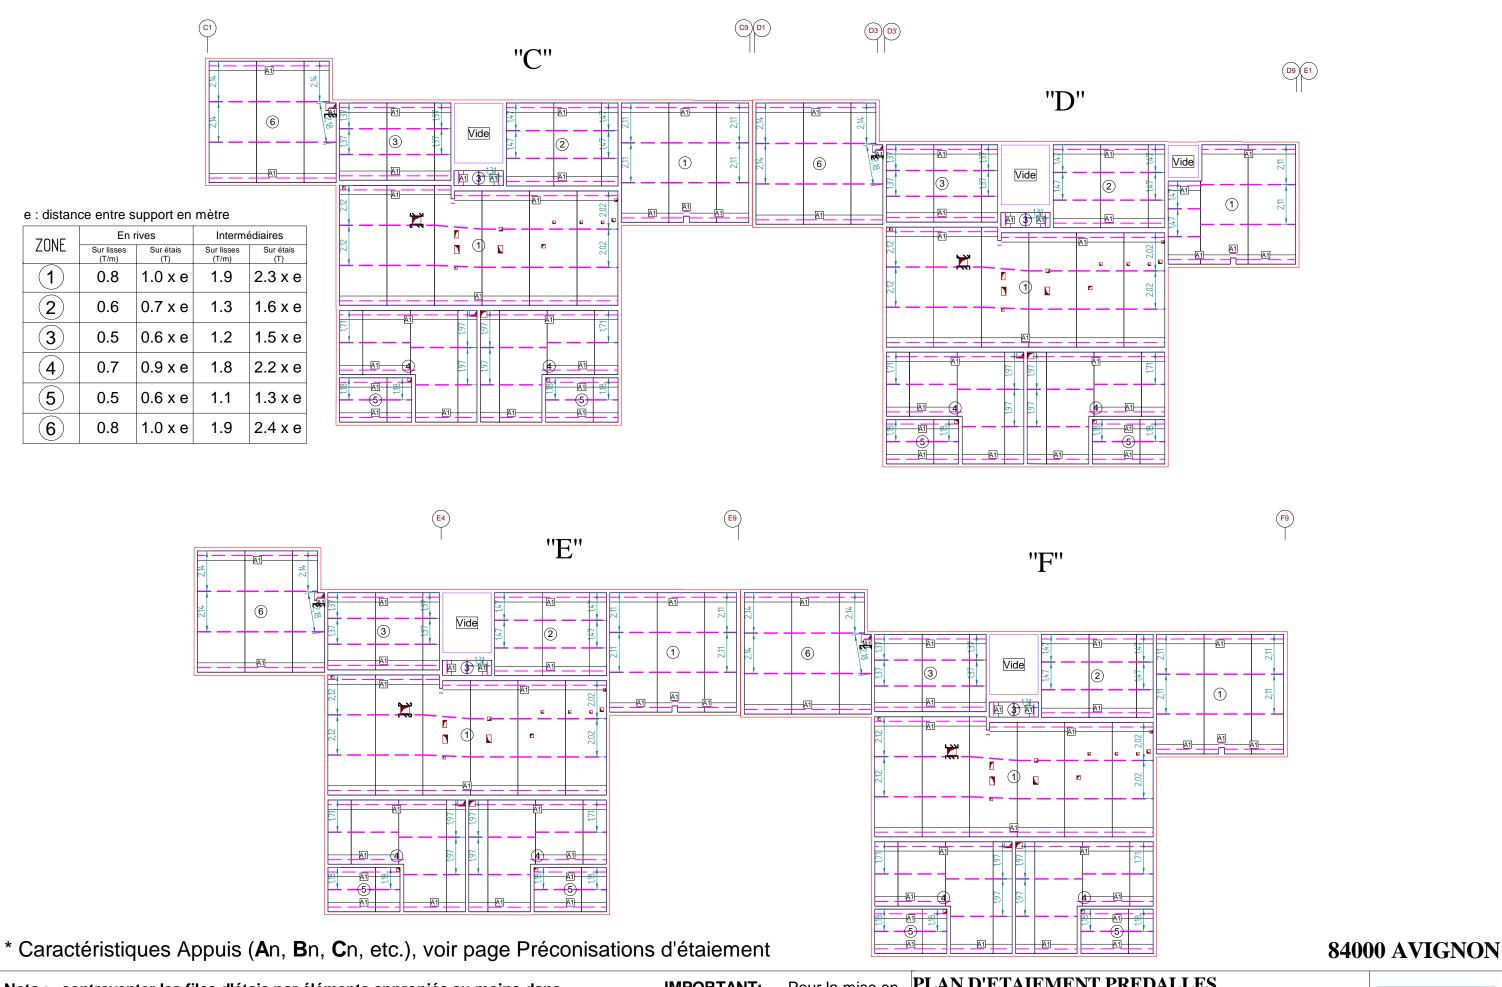


Nota: contreventer les files d'étais par éléments appropiés au moins dans deux plans perpendiculaires (les trépieds n'assurent pas le contreventement)

IMPORTANT: Pour la mise en oeuvre d'étaiements, se reporter aux préconisations (page 1)

PLAN D'ETAIEMENT PREDALLES Joint Prédalles Page NIVEAU: Plan N° Echelle **HTRDC** 4/8 PXD4

Affaire KP1:3180297 Niveau KP1:CDEFRDC

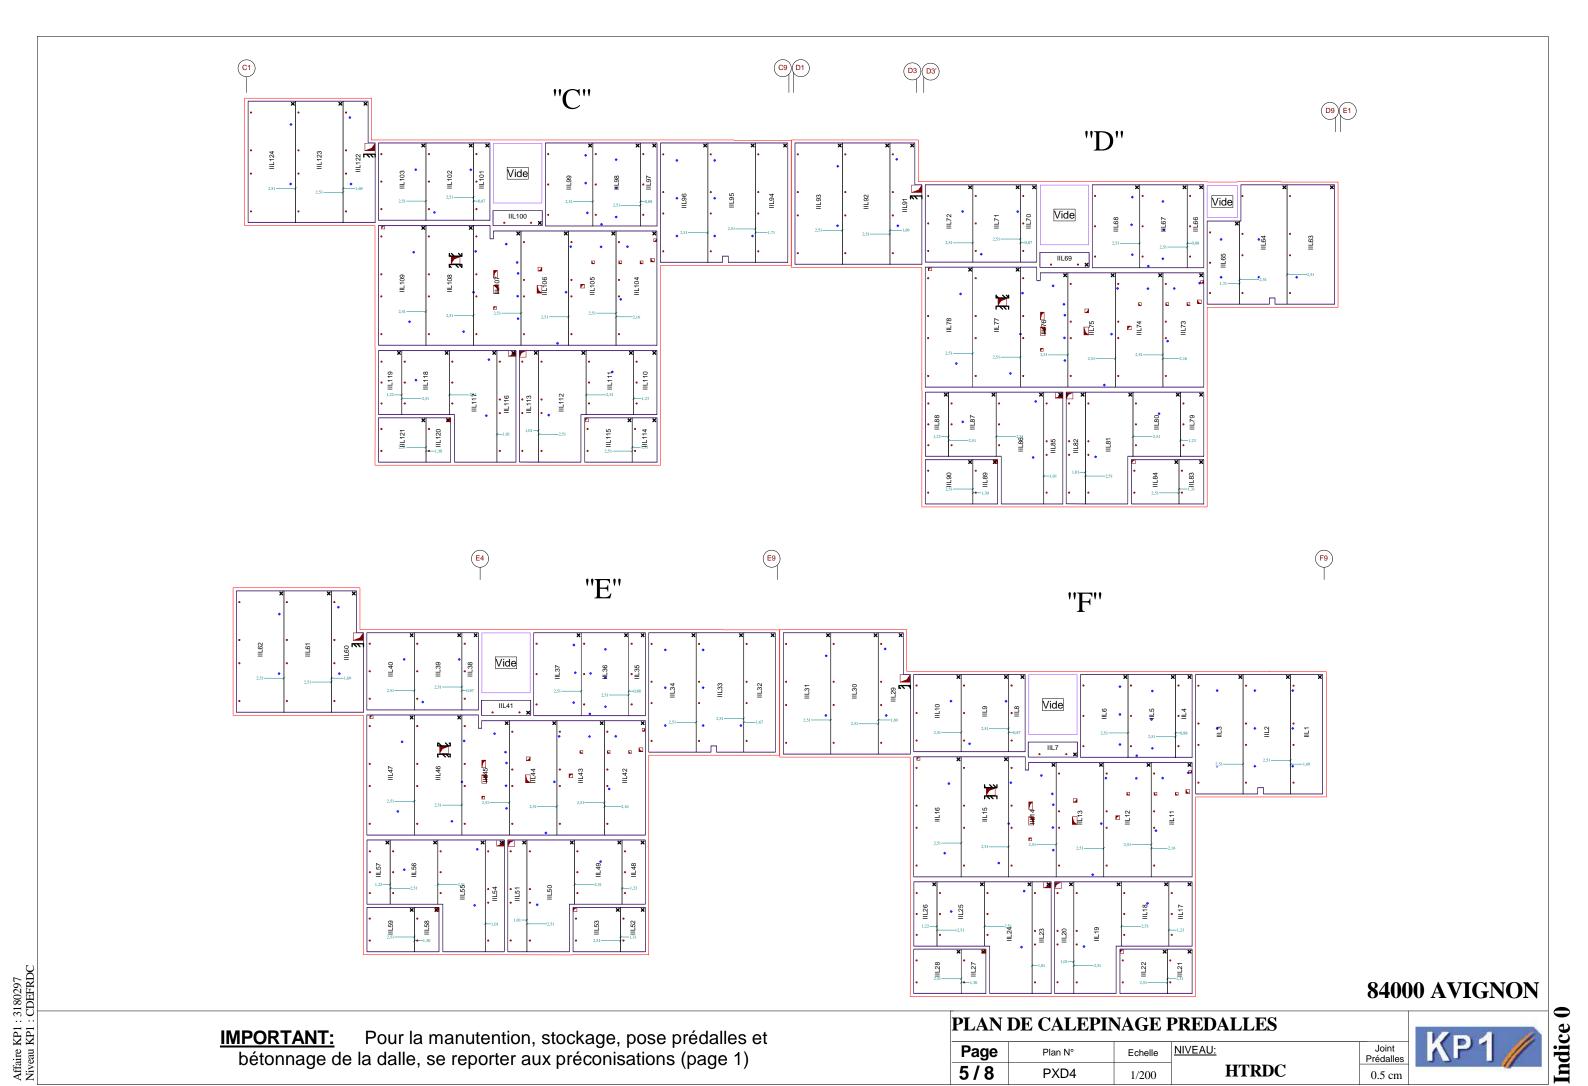

préconisations (pages 1 et 2)

Echelle

1/200

Plan N°

PXD4

NIVEAU:

HTRDC


Page

6/8

Joint Prédalles


0.5 cm



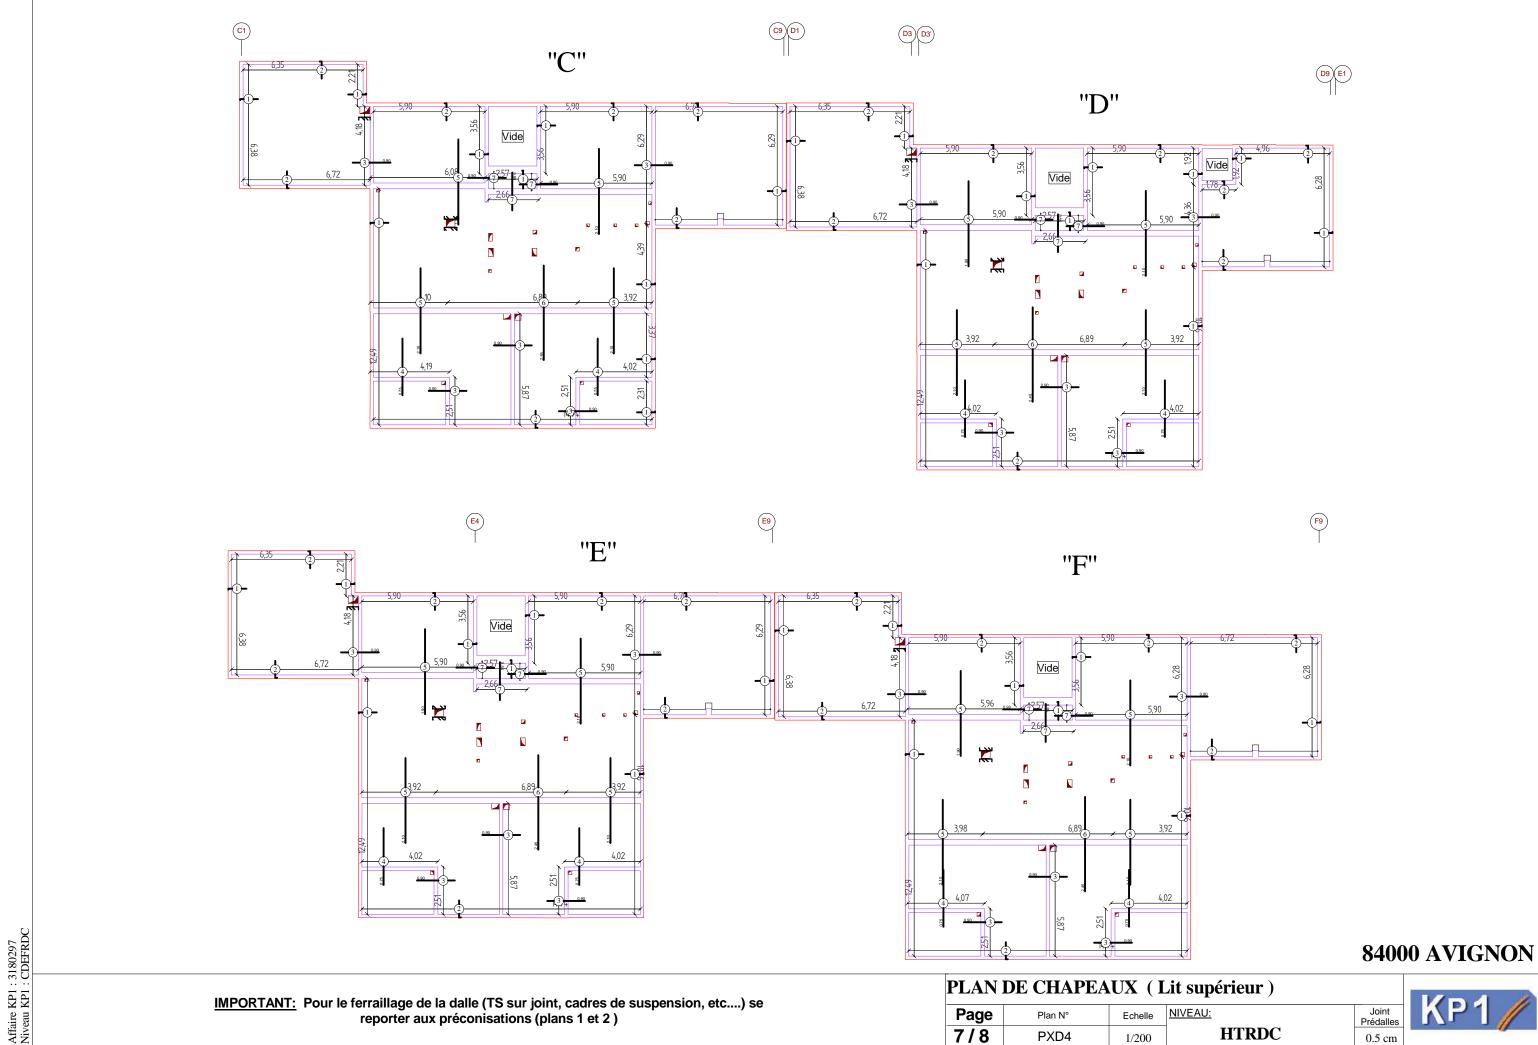

<u>IMPORTANT:</u> Pour le ferraillage de la dalle (TS sur joint, cadres de suspension, etc....) se reporter aux préconisations (plans 1 et 2)

Page NIVEAU: Plan N° Echelle

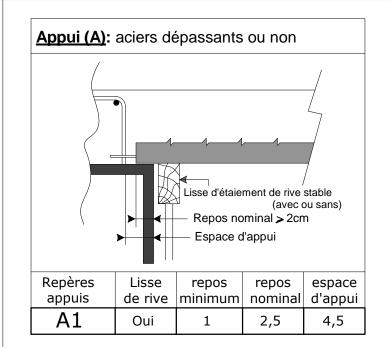

PRECONISATIONS D'APPUIS DES PREDALLES

Page	Plan N°	Joint	NIVEAU:
8/8	PXD4		HTRDC

